2.2.3. Planche n°3 : Demi-échangeur de Saint-Sébastien-de-Morsent / Extrémité Ouest

Dans cette partie, la déviation traverse un milieu au relief plus prononcé. Quittant la vallée de l'Iton, le projet franchit le bois de la Garenne, le Plateau de la Grande Pièce puis le bois du Roi avant de se raccorder à la RN 1013. Quelques bâtis sont recensés, dont notamment le Centre Hospitalier Spécialisé de Navarre, plusieurs habitations à l'extrémité Ouest du projet.

Plusieurs engagements localisés ont été définis pour cette section :

Thématique		Engagements
Bruit	Nuisances sonores	Mise en œuvre de protections acoustiques
Eaux souterraines et superficielles	Système d'assainissement	Aménagement de bassins de traitement des eaux : Bassins n°3a et 3b (vallée de l'Iton). Pour ces deux bassins : entretien dont curage annuel
	Reconstitution des berges de l'Iton	Rétablissement de la ripisylve sur les deux rives des bras de l'Iton (Diffluence des trois bras à la limite aval avec la rue des Domaines)
	Respect du PPRI	Franchissement du bras du Gors par le biais d'un ouvrage spécifique
Milieu naturel	Protection des zones sensibles	Balisage d'espèces végétales protégées Balisage d'espèces végétales protégées et récolte de graines, déplacement, réimplantation Balisage d'habitats Aménagement / restauration d'ourlets calcicoles En phase travaux, mise en place d'une clôture anti-batraciens
	Limitation du risque de collision faune / trafic	Mise en œuvre d'une végétation arbustive, d'arbres, de haies Mise en place d'une clôture à faune et de panneaux de signalisation (traversées d'animaux)
	Transparence de la déviation vis-à-vis de la faune	Aménagement de deux passages inférieurs Aménagement d'un « Ecuroduc »
	Création de zones boisées	Boisements compensatoires
	Mesures spécifiques à la flore	Aménagement de zones favorables à l'Orobanche de la Picride
	Mesures spécifiques à la faune	Création de gîtes artificiels à chiroptères Aménagement d'*hibernaculum*

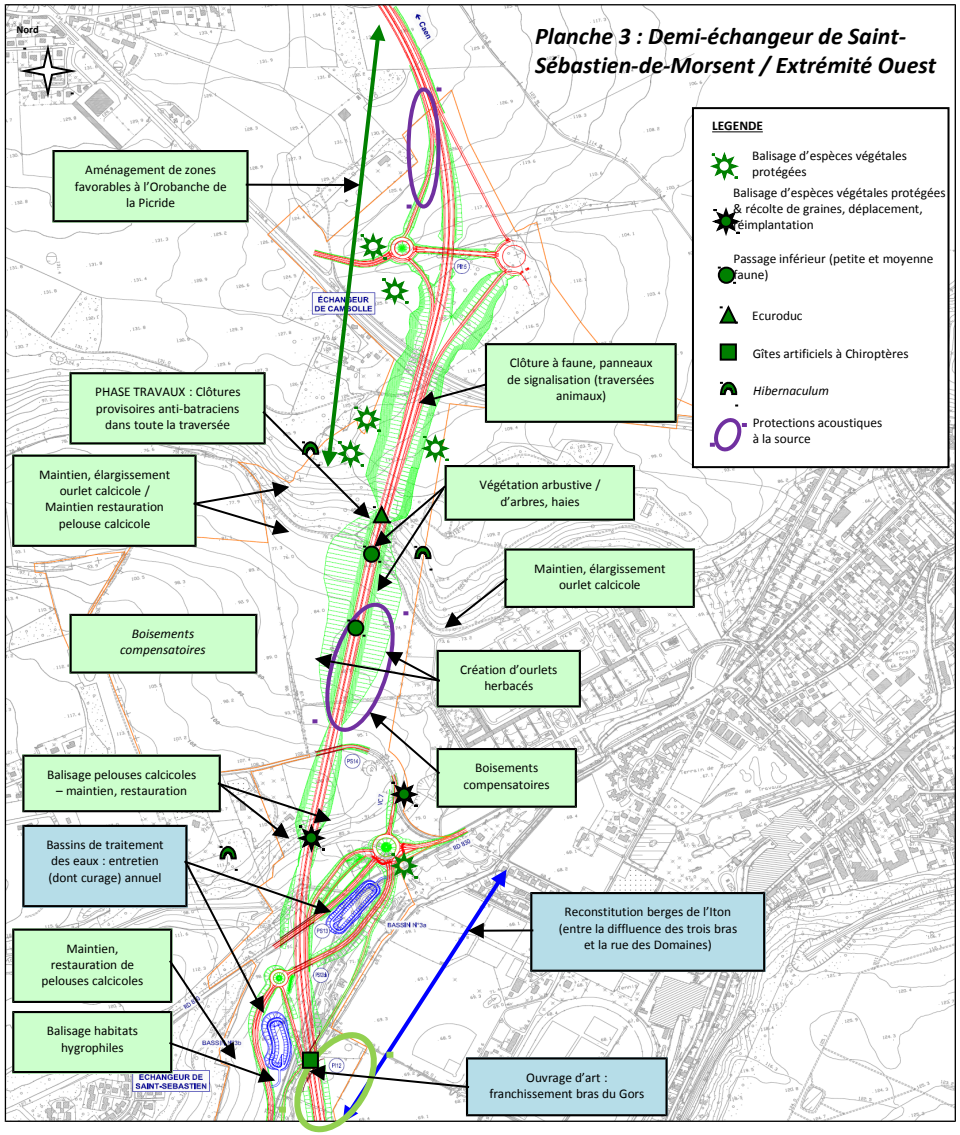
Planche 3 : Demi-échangeur de Saint-Sébastien-de-Morsent / Extrémité Ouest
Nord
LEGENDE
Balisage d'espèces végétales protégées
Balisage d'espèces végétales protégées & récolte de graines, déplacement, réimplantation
Passage inférieur (petite et moyenne faune)
Ecuroduc
Gîtes artificiels à Chiroptères
Hibernaculum
Protections acoustiques à la source
Aménagement de zones favorables à l'Orobanche de la Picride
PHASE TRAVAUX : Clôtures provisoires anti-batraciens dans toute la traversée
Maintien, élargissement ourlet calcicole / Maintien restauration pelouse calcicole
Boisements compensatoires
Balisage pelouses calcicoles – maintien, restauration
Bassins de traitement des eaux : entretien (dont curage) annuel
Maintien, restauration de pelouses calcicoles
Balisage habitats hygrophiles
Clôture à faune, panneaux de signalisation (traversées animaux)
Végétation arbustive / d'arbres, haies
Maintien, élargissement ourlet calcicole
Création d'ourlets herbacés
Boisements compensatoires
Reconstitution berges de l'Iton (entre la diffluence des trois bras et la rue des Domaines)
Ouvrage d'art : franchissement bras du Gors
ÉCHANGEUR DE CAMBOLLE
ÉCHANGEUR DE SAINT-SEBASTIEN
BASSIN N°3a
BASSIN N°3b
Chartres
